
































































Projet de refonte de l'infrastructure de DansMaRue


ID		Task Mode	Nom de la tâche	17 Oct '22				31 Oct '22				14 Nov '22				28 Nov '22				12 Dec '22				26 Dec '22			
				09	13	17	21	25	29	02	06	10	14	18	22	26	30	04	08	12	16	20	24	28	01	05	
66			Livraison dev archivage + FD																								
67			Paramétrage, dev & tests Dev Arch																								
68			Archivage recette																								
69			Livraison recette archivage + FD																								
70			Paramétrage, dev & tests R7 Arch																								
71			Tests MOE																								
72			Tests MOA																								
73			Corrections ACN																								
74			Archivage Prod																								
75			Livraison archivage prod + FD																								
76			tests archivage prod																								
77			Divers																								
78			Test Lutèce & Ubuntu 22																								
79			Décomissionnement																								
80			Décommissionnement des vm ancienne infra																								
81			Décommissionnement des VM de Dev 2																								

Projet : Refonte_infra_DMR_pla Date : Mon 11/11/24	Tâche		Jalon inactif		Début uniquement		Fractionnement critique	
	Fractionnement		Récapitulatif inactif		Fin uniquement		Avancement	
	Jalon		Tâche manuelle		Tâches externes		Progression manuelle	
	Récapitulative		Durée uniquement		Jalons externes			
	Récapitulatif du projet		Report récapitulatif manuel		Échéance			
	Tâche inactive		Récapitulatif manuel		Critique			


Projet de refonte de l'infrastructure de DansMaRue





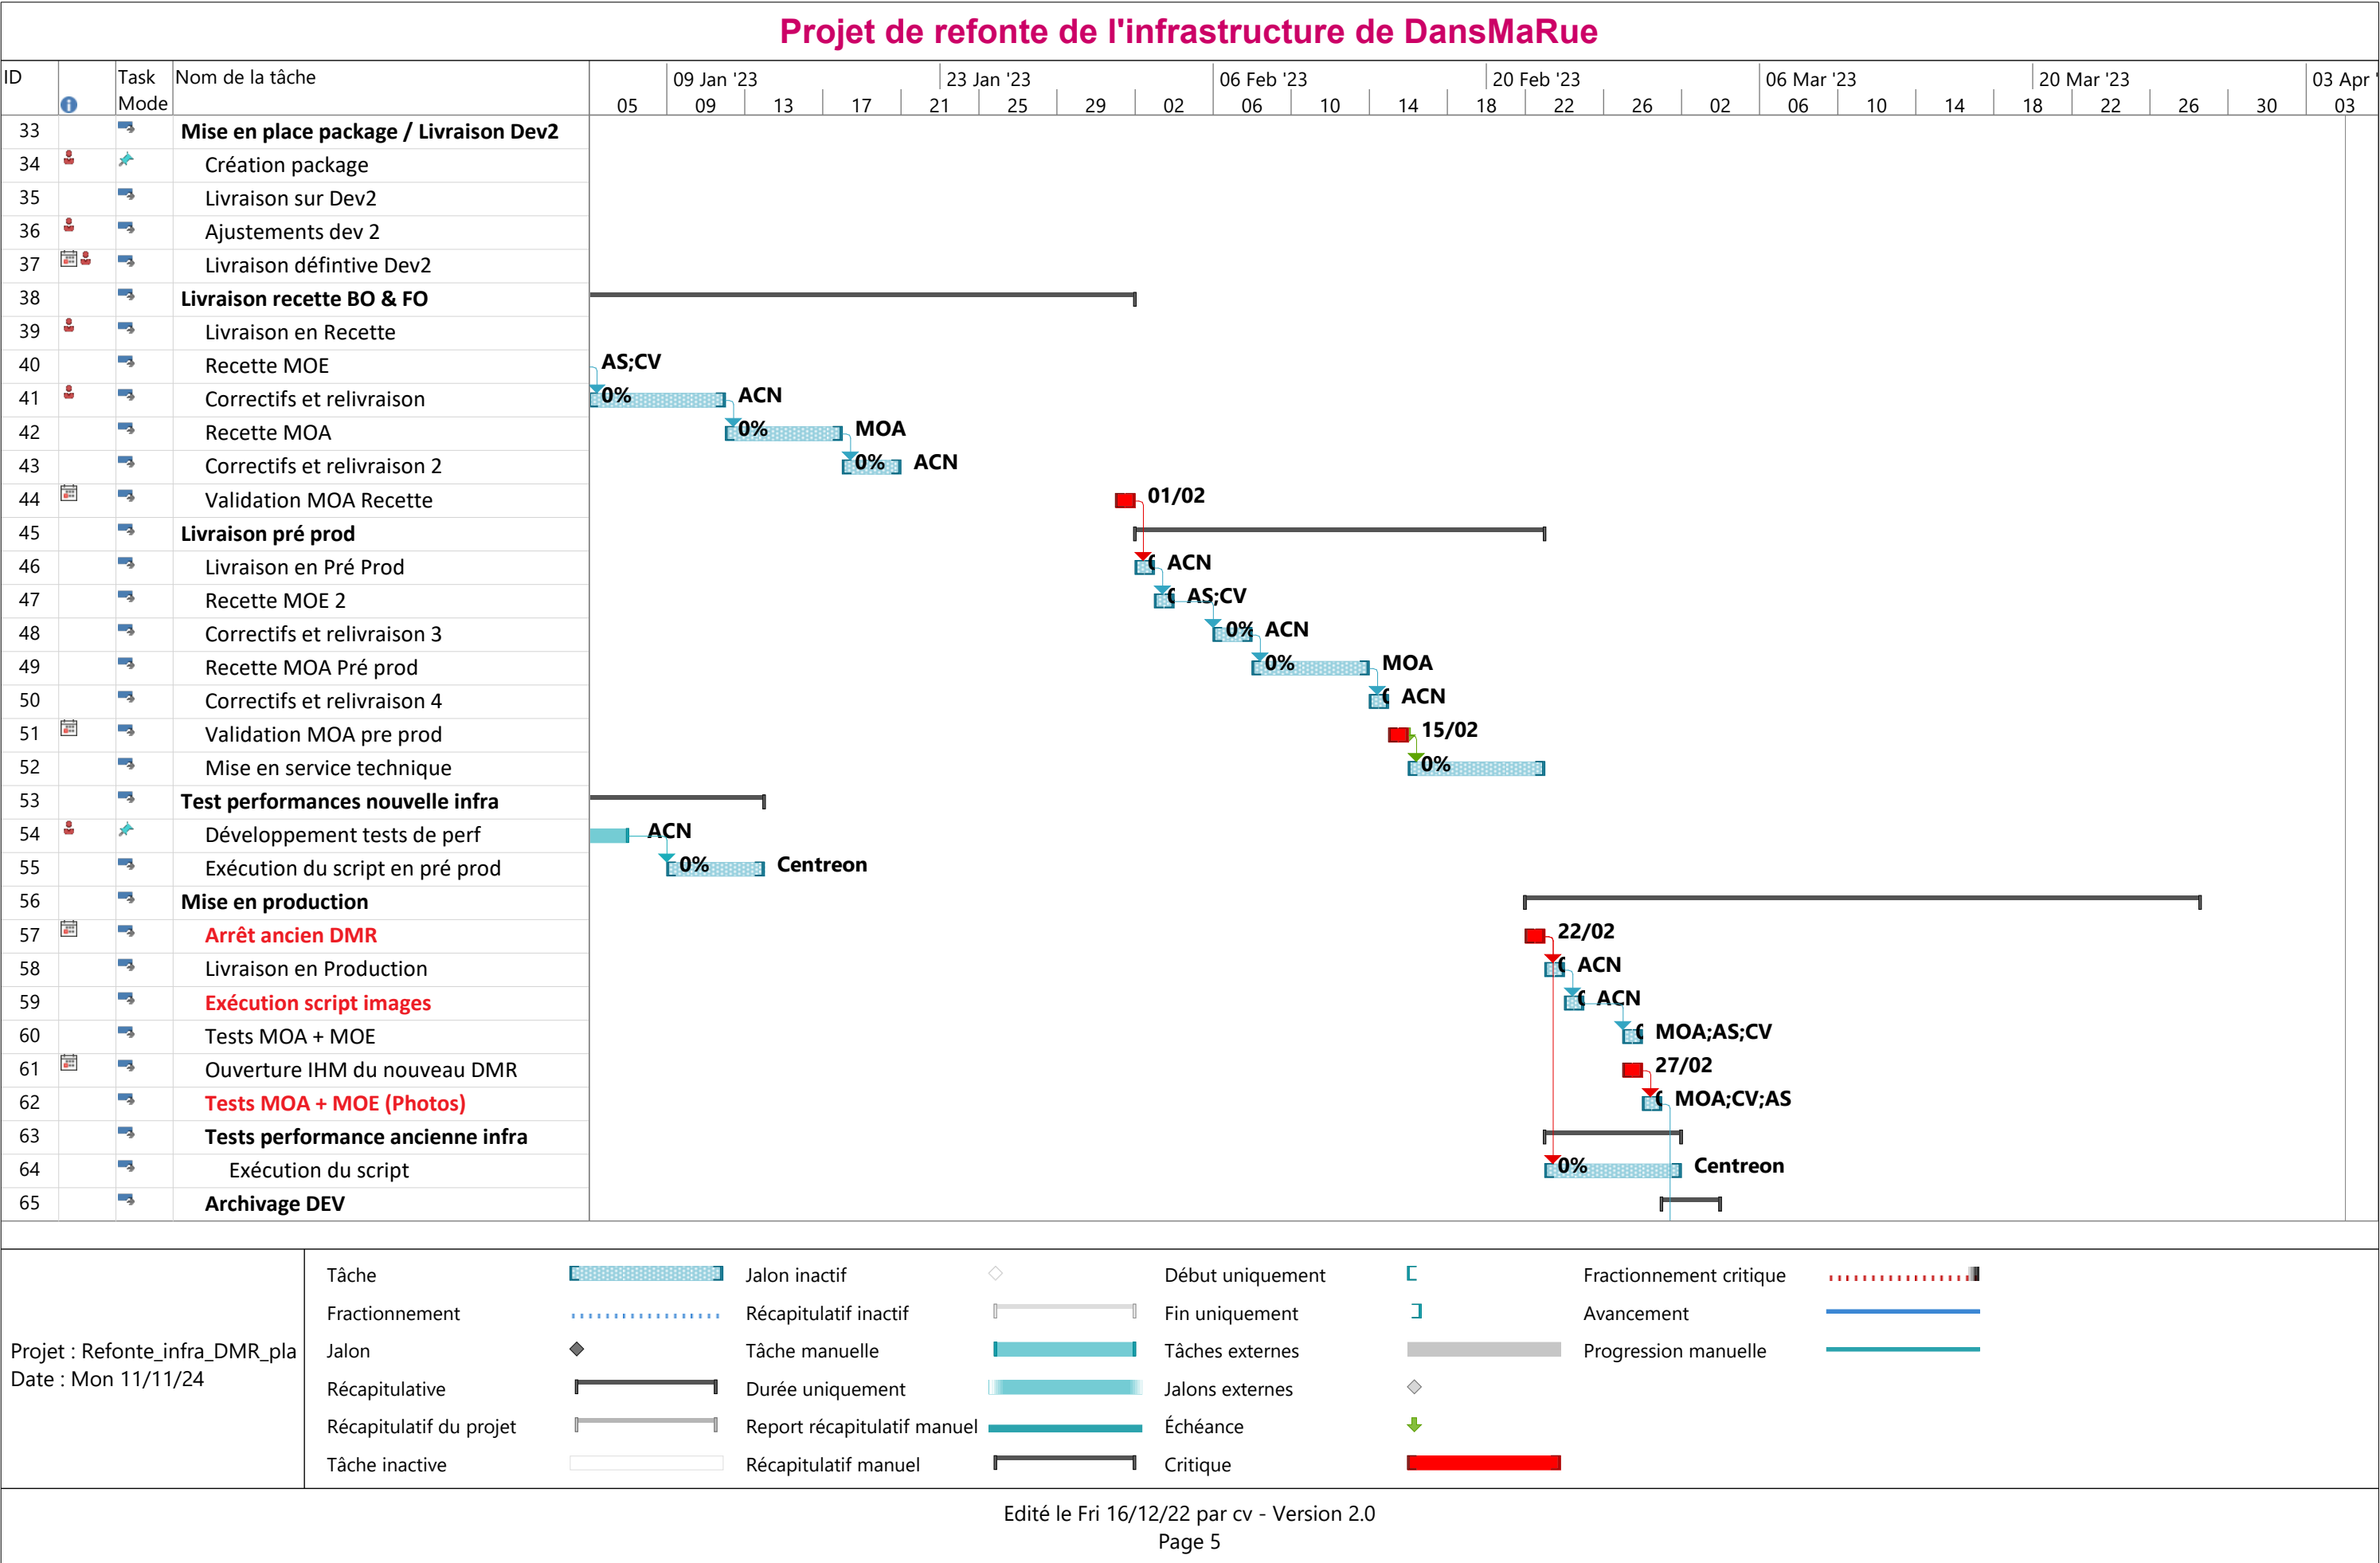



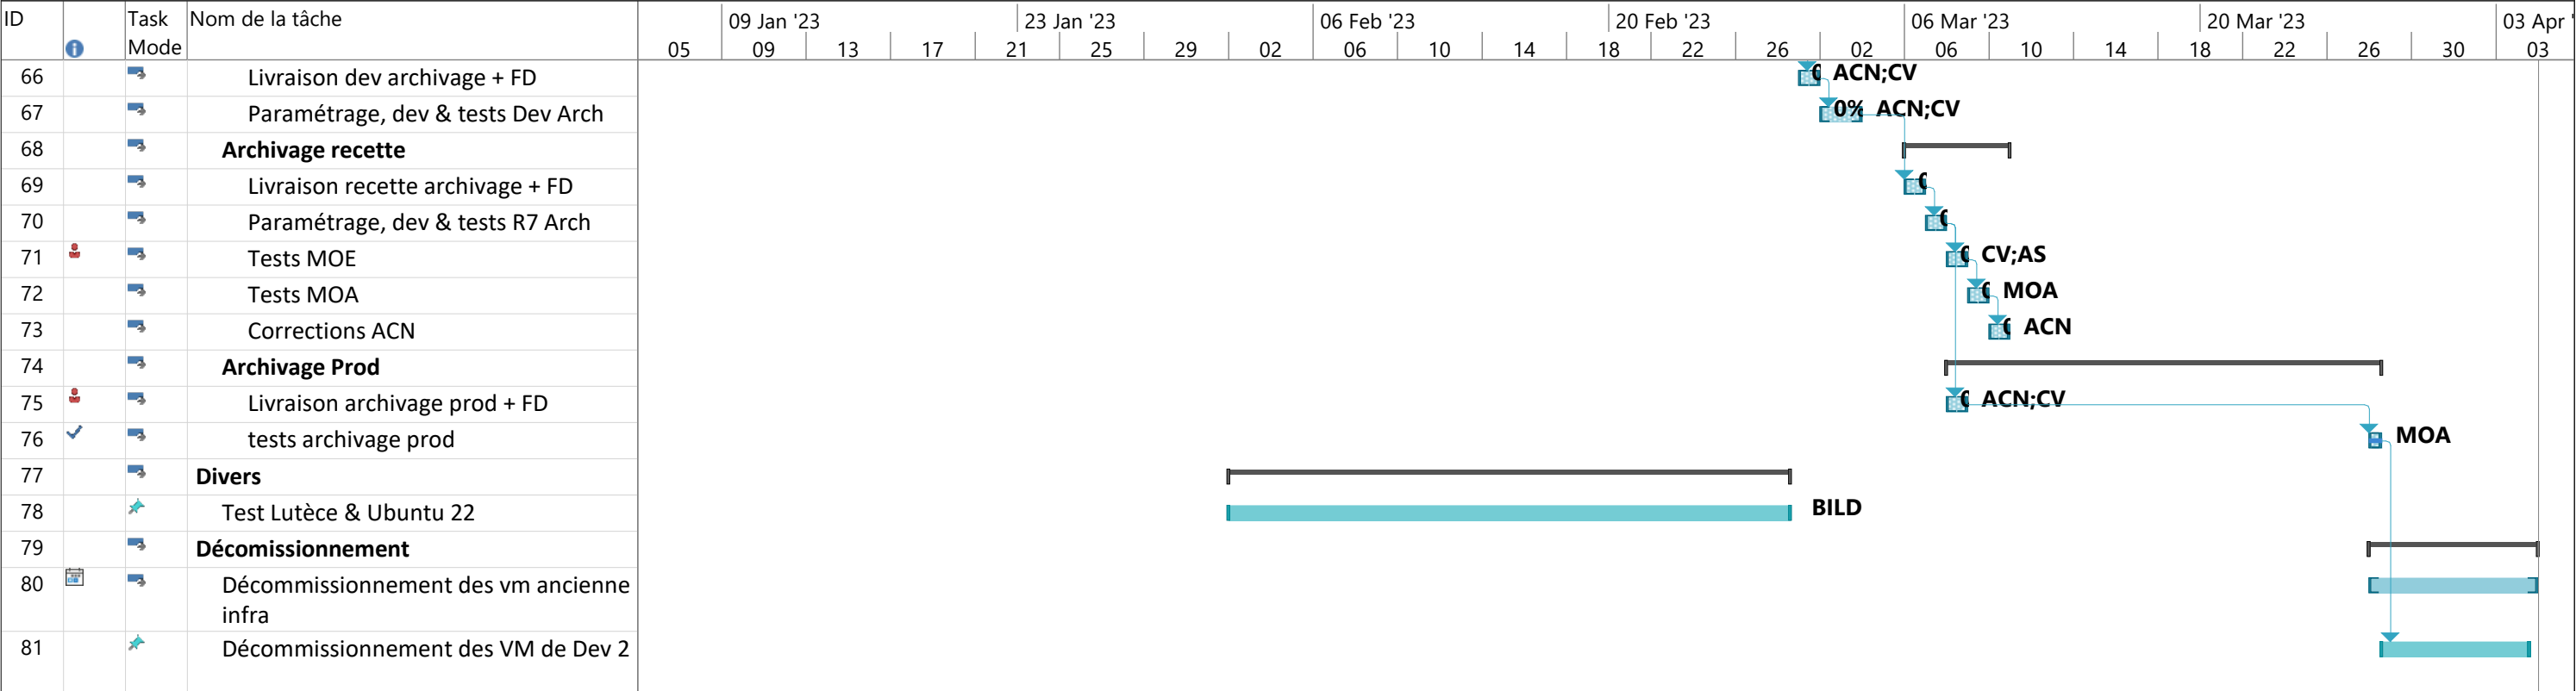












ID	Task Mode	Nom de la tâche	09 Jan '23				23 Jan '23				06 Feb '23				20 Feb '23				06 Mar '23				20 Mar '23				03 Apr '23	
			05	09	13	17	21	25	29	02	06	10	14	18	22	26	02	06	10	14	18	22	26	30	03			
1			Documents divers																									
2			Envoi du devis																									
3			Commande																									
4			Edb Sécurité																									
5			Finalisation DAT																									
6			Finalisation dossier d'installation																									
7			Mise en support / Exploitation																									
8			Préparation																									
9			Construction du dossier																									
10			Modifications Prestataires																									
11			Etablir la liste des prestataires																									
12			Communication 1																									
13			Etablir une doc technique																									
14			Diffuser la documentation																									
15			Communication 2																									
16			<div></div> PT																									
17			Mise en place de l'infrastructure																									
18			Création des noms de machines																									
19			Création des VM																									
20			Demande processus Gravitee																									
21			Mise à dispositon de Gravitee																									
22			Demande processus NetApp																									
23			Mise a disposition de NetApp																									
24			Livraison DEV																									
25			Installation fichiers & BDD																									
26			Test environnement dev																									
27			Développement																									
28			<div></div> ACN																									
29			Prise en compte de Gravitee et NetApp																									
30			Vérification de la sécurisation appli																									
31			Validation niveau sécurité (STIN / STIPS)																									
32			Finalisation installation Gravitee																									

Projet : Refonte_infra_DMR_pla Date : Mon 11/11/24	Tâche		Jalon inactif		Début uniquement		Fractionnement critique	
	Fractionnement		Récapitulatif inactif		Fin uniquement		Avancement	
	Jalon		Tâche manuelle		Tâches externes		Progression manuelle	
	Récapitulative		Durée uniquement		Jalons externes			
	Récapitulatif du projet		Report récapitulatif manuel		Échéance			
	Tâche inactive		Récapitulatif manuel		Critique			
























Projet de refonte de l'infrastructure de DansMaRue















































Projet : Refonte_infra_DMR_pla Date : Mon 11/11/24	Tâche		Jalon inactif		Début uniquement		Fractionnement critique	
	Fractionnement		Récapitulatif inactif		Fin uniquement		Avancement	
	Jalon		Tâche manuelle		Tâches externes		Progression manuelle	
	Récapitulative		Durée uniquement		Jalons externes			
	Récapitulatif du projet		Report récapitulatif manuel		Échéance			
	Tâche inactive		Récapitulatif manuel		Critique			

Projet de refonte de l'infrastructure de DansMaRue

ID	Task Mode	Nom de la tâche	03 Apr '23				17 Apr '23				01 May '23				15 May '23				29 May '23				12 Jun '23				26 Jun '23	
			03	07	11	15	19	23	27	01	05	09	13	17	21	25	29	02	06	10	14	18	22	26	30			
1			Documents divers																									
2			Envoi du devis																									
3			Commande																									
4			Edb Sécurité																									
5			Finalisation DAT																									
6			Finalisation dossier d'installation																									
7			Mise en support / Exploitation																									
8			Préparation																									
9			Construction du dossier																									
10			Modifications Prestataires																									
11			Etablir la liste des prestataires																									
12			Communication 1																									
13			Etablir une doc technique																									
14			Diffuser la documentation																									
15			Communication 2																									
16			Dev et tests prestataire																									
17			Mise en place de l'infrastructure																									
18			Création des noms de machines																									
19			Création des VM																									
20			Demande processus Gravitee																									
21			Mise à dispositon de Gravitee																									
22			Demande processus NetApp																									
23			Mise a disposition de NetApp																									
24			Livraison DEV																									
25			Installation fichiers & BDD																									
26			Test environnement dev																									
27			Développement																									
28			Développement + Cast																									
29			Prise en compte de Gravitee et NetApp																									
30			Vérification de la sécurisation appli																									
31			Validation niveau sécurité (STIN / STIPS)																									
32			Finalisation installation Gravitee																									

Projet : Refonte_infra_DMR_pla Date : Mon 11/11/24	Tâche		Jalon inactif		Début uniquement		Fractionnement critique	
	Fractionnement		Récapitulatif inactif		Fin uniquement		Avancement	
	Jalon		Tâche manuelle		Tâches externes		Progression manuelle	
	Récapitulative		Durée uniquement		Jalons externes			
	Récapitulatif du projet		Report récapitulatif manuel		Échéance			
	Tâche inactive		Récapitulatif manuel		Critique			

Projet de refonte de l'infrastructure de DansMaRue

ID		Task Mode	Nom de la tâche	03 Apr '23				17 Apr '23				01 May '23				15 May '23				29 May '23				12 Jun '23				26 Jun '23	
				03	07	11	15	19	23	27	01	05	09	13	17	21	25	29	02	06	10	14	18	22	26	30			
33			Mise en place package / Livraison Dev2																										
34			Création package																										
35			Livraison sur Dev2																										
36			Ajustements dev 2																										
37	 		Livraison défintive Dev2																										
38			Livraison recette BO & FO																										
39			Livraison en Recette																										
40			Recette MOE																										
41			Correctifs et relivraison																										
42			Recette MOA																										
43			Correctifs et relivraison 2																										
44			Validation MOA Recette																										
45			Livraison pré prod																										
46			Livraison en Pré Prod																										
47			Recette MOE 2																										
48			Correctifs et relivraison 3																										
49			Recette MOA Pré prod																										
50			Correctifs et relivraison 4																										
51			Validation MOA pre prod																										
52			Mise en service technique																										
53			Test performances nouvelle infra																										
54			Développement tests de perf																										
55			Exécution du script en pré prod																										
56			Mise en production																										
57			Arrêt ancien DMR																										
58			Livraison en Production																										
59			Exécution script images																										
60			Tests MOA + MOE																										
61			Ouverture IHM du nouveau DMR																										
62			Tests MOA + MOE (Photos)																										
63			Tests performance ancienne infra																										
64			Exécution du script																										
65			Archivage DEV																										

Projet : Refonte_infra_DMR_pla Date : Mon 11/11/24	Tâche		Jalon inactif		Début uniquement		Fractionnement critique	
	Fractionnement		Récapitulatif inactif		Fin uniquement		Avancement	
	Jalon		Tâche manuelle		Tâches externes		Progression manuelle	
	Récapitulative		Durée uniquement		Jalons externes			
	Récapitulatif du projet		Report récapitulatif manuel		Échéance			
	Tâche inactive		Récapitulatif manuel		Critique			

